

広島市北部地区学校給食センター（仮称）等の整備状況について

【工程表】

工事内容 ／工期	令和 6 年度						令和 7 年度							
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
準備・仮設工事														
基礎工事														
鉄骨工事														
躯体工事														
外装工事														
屋根工事														
内装工事														
設備工事														
外構工事	 													
検査・調整														

○ 令和6年10月から本格的な整備工事に着手した後、基礎工事を進め、令和7年3月下旬からは鉄骨工事を進めています。

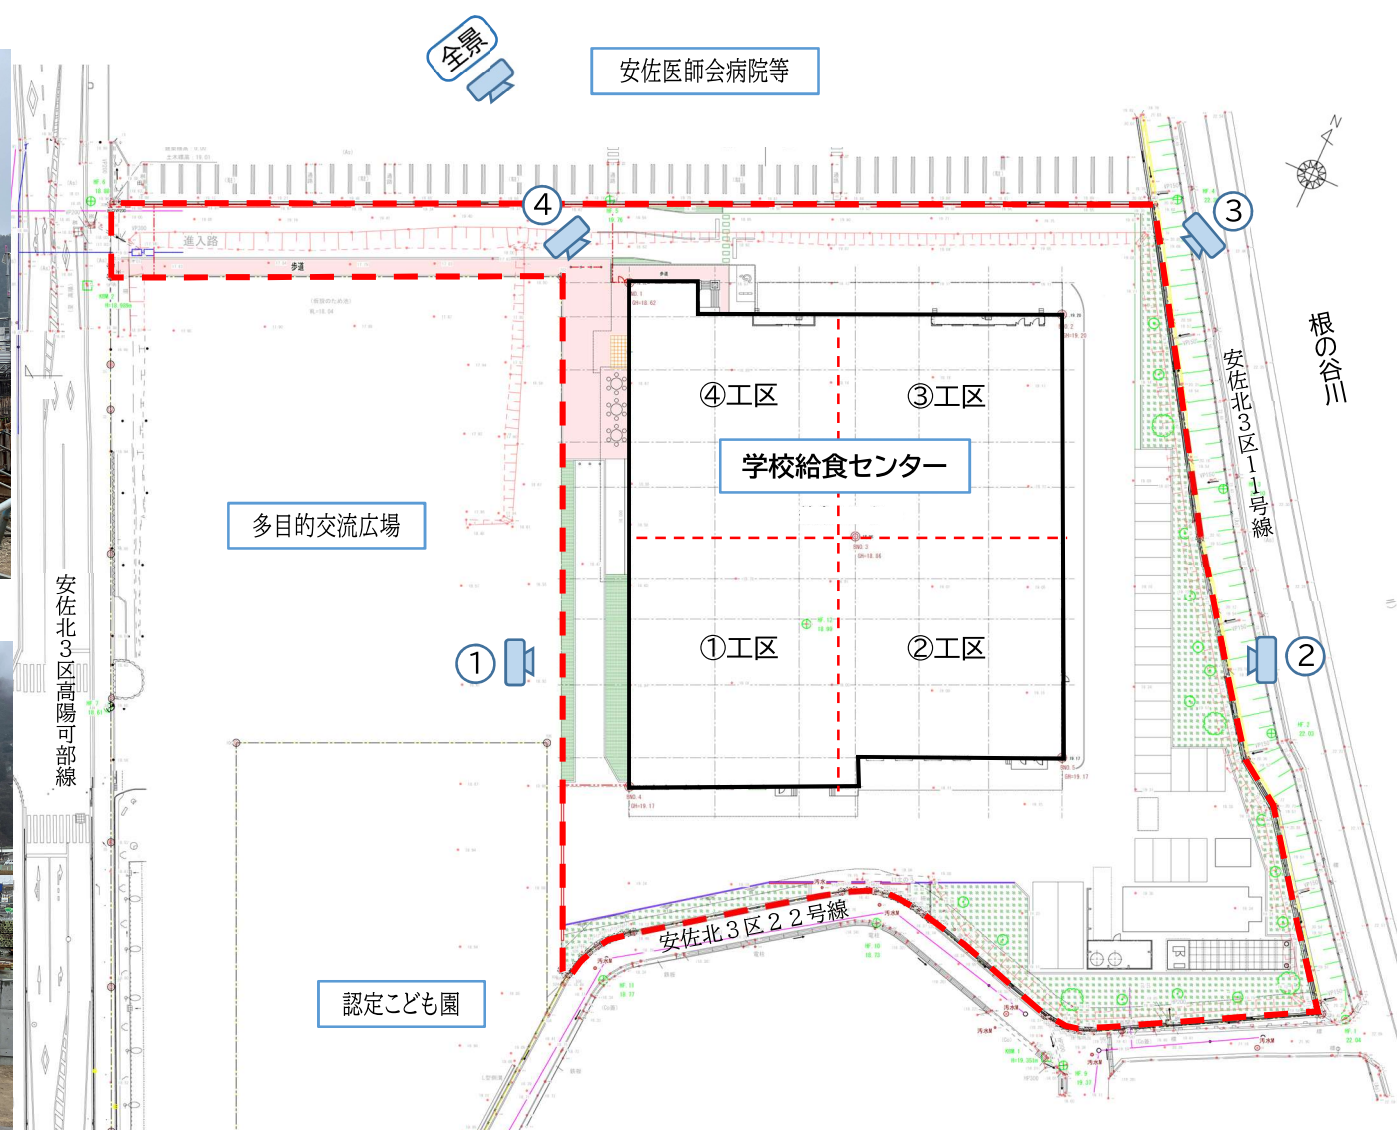
○ 4月からは躯体、外装、屋根の工事へと進み、7月末には施設の外観がおおむね完成する予定です。

その後、内装工事などを進め、10月末までに施設を完成させた後、11月からは調理リハーサルなどの開業に向けた準備に入る予定です。

敷地全景（安佐医師会病院より撮影）



【全景写真】2月26日撮影

④工区（敷地北西面より撮影）
型枠・配筋工事①工区（敷地西面より撮影）
基礎コンクリート打設③工区（敷地北東面より撮影）
型枠・配筋工事②工区（敷地東面より撮影）
型枠・配筋工事

【各工区写真】3月15日撮影
