


可部南認定こども園（仮称）の整備状況について

【工程表】

	令和6年度			令和7年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
建築工事	→														
準備期間	→														
仮設工事	→														
基礎工事			→												
躯体工事					→										
外装工事										→					
屋上工事											→				
内装工事												→			
外構工事												→			
敷地進入路工事 (歩道切下げほか)			→										→		
各種検査ほか														→	

3/28

- 今月から基礎工事を開始しており、5月頃には躯体工事に着手する予定です。
- 今後、敷地南側の道路からの給水管の引き込みと、敷地東側の道路からの下水管の引き込みを行う際には、工事箇所での交通規制が必要になると見込んでいます。このため、当該工事については、周知期間をしっかりと確保して、近隣にお住まいの皆さまに作業日等をお知らせした上で作業に着手いたします。

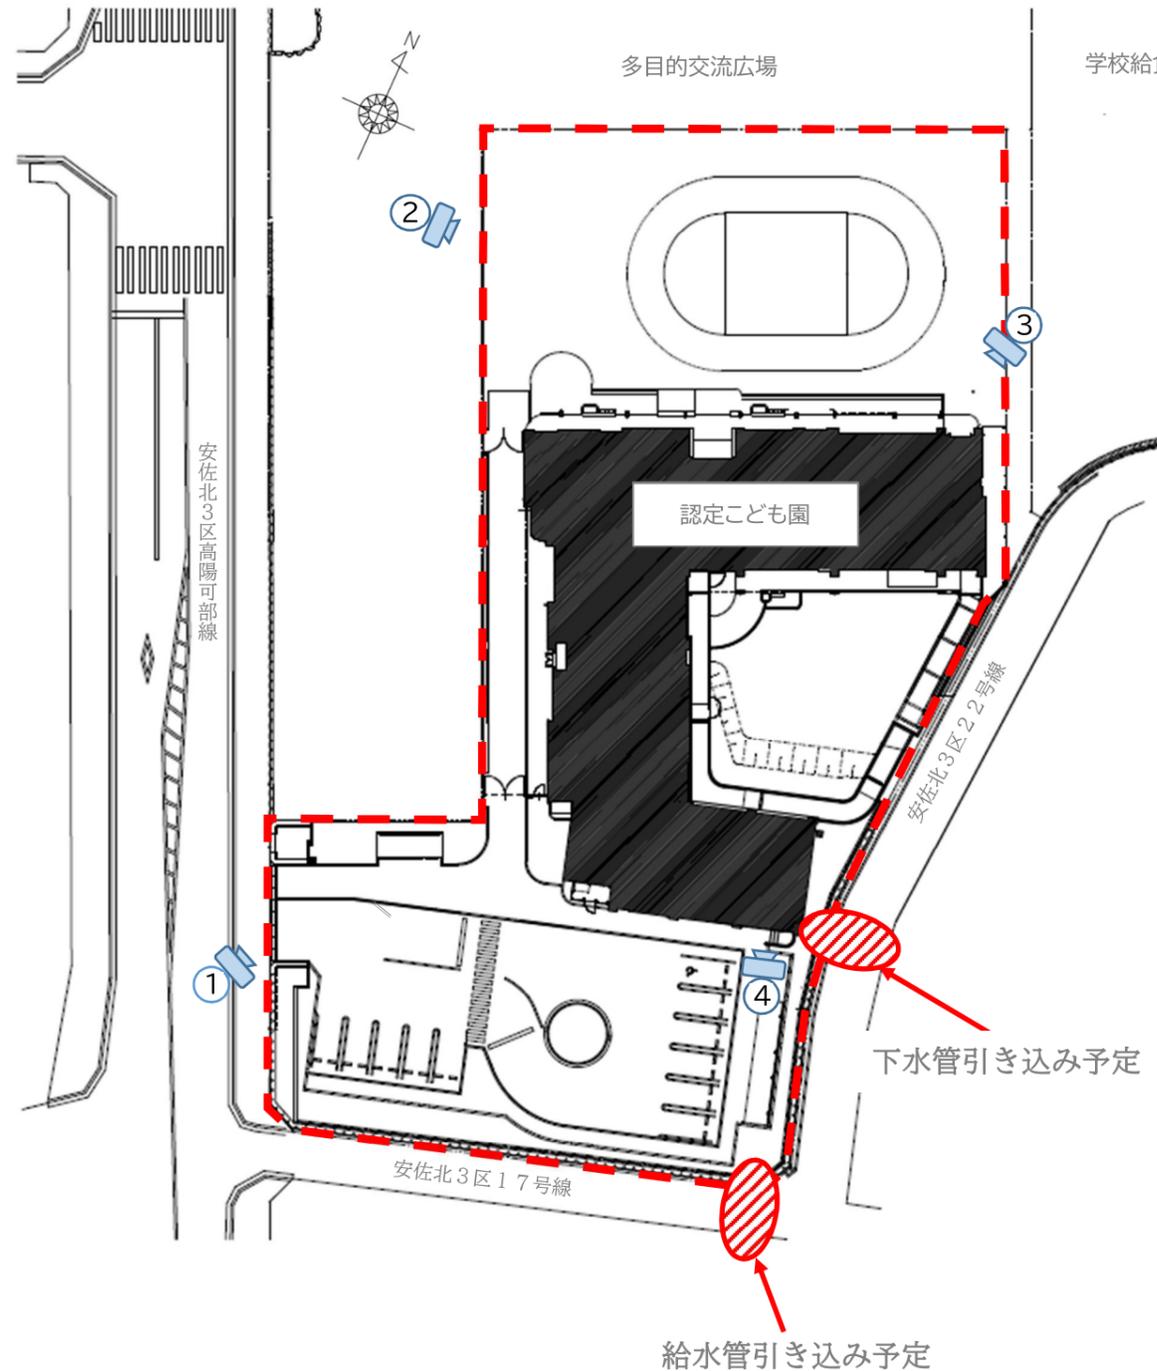

【現況写真】
3月10日時点
