

下水道工事に伴う道路陥没事故	令和7年 7月号
復旧工事かわら版	

清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
広島市下水道局施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしており、心よりお詫び申し上げます。

地域の皆さまへは、工事の騒音等でご迷惑をお掛けしておりますが、皆さまのご協力により、下水道管の復旧工事も着実に進んでおります。下水道管の仮復旧も無事完了し、7月からは地盤沈下対策工事にも着手できることとなりました。ご協力感謝いたします。引き続き工事へのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- 《7月の作業内容》
- 昼間工事（8：00 ～ 18：00）※日曜日は原則休工とします。
- ・仮設工事（ヤード整備）
 - ・下水道管復旧工事（掘削・土留支保工・マンホール躯体構築）
 - ・建屋解体工事（建屋解体）
 - ・地盤沈下対策工事
- 夜間工事（18：00 ～ 翌5：00）※土・日曜日の夜間は原則休工とします。
- ・下水道管復旧工事（掘削・土留支保工・マンホール躯体構築）

- 《その他》
- ・通勤通学時間帯（7：30 ～ 9：00）および夜間は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。
 - ・天候、進捗によっては予定を変更させていただく場合もございます。

《工程表（予定）》

年月日 工事内容	令和7年7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
仮設工事	【昼】工事ヤード整備																															
建屋解体工事	【昼】建屋解体																															
																												7月末	完了予定			
下水道管 復旧工事	【昼】損傷部本復旧（掘削・土留支保工・マンホール躯体構築）																															
	【夜】損傷部本復旧（掘削・土留支保工・マンホール躯体構築）																															
																																9月中
地盤沈下対策工	【昼】地表面沈下計測、モニタリング																															
																																8月末


※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。（J VのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

- 《次号 復旧工事かわら版 発行予定日》
- ・令和7年7月25日に発行を予定しております。


- 《8月の作業内容》
- ・仮設工事
 - ・下水道管復旧工事（マンホール躯体構築、下水道管設置工、下水道管切替工）

《地盤沈下対策工事について》


圧密未了領域を解消するため、急激な落ち込みの発生が確認された範囲の地盤を改良します。

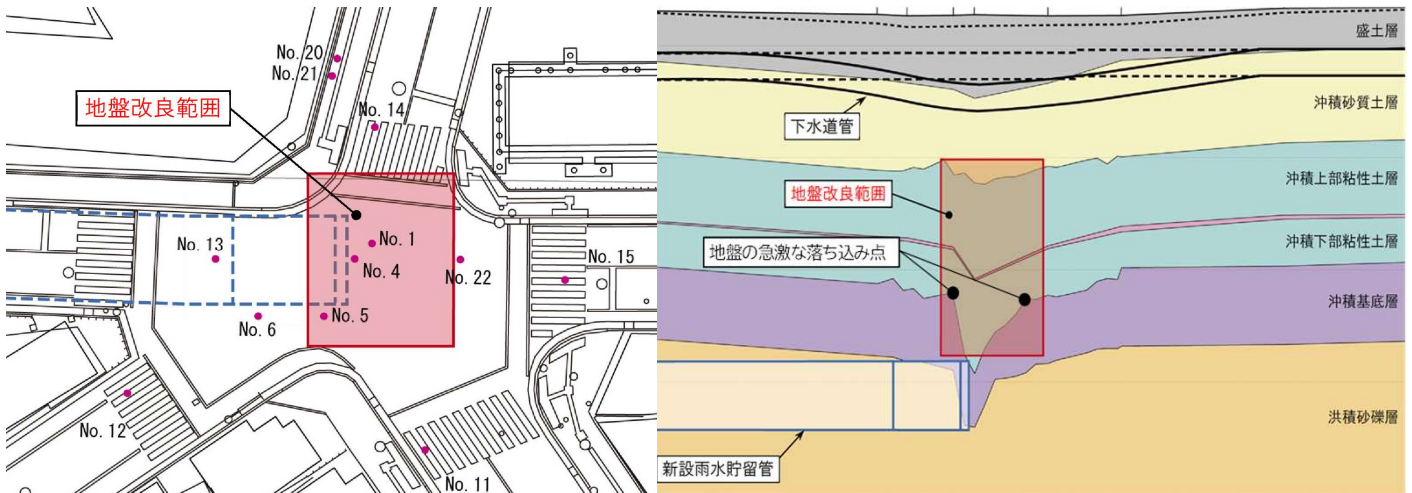

《施工イメージ》

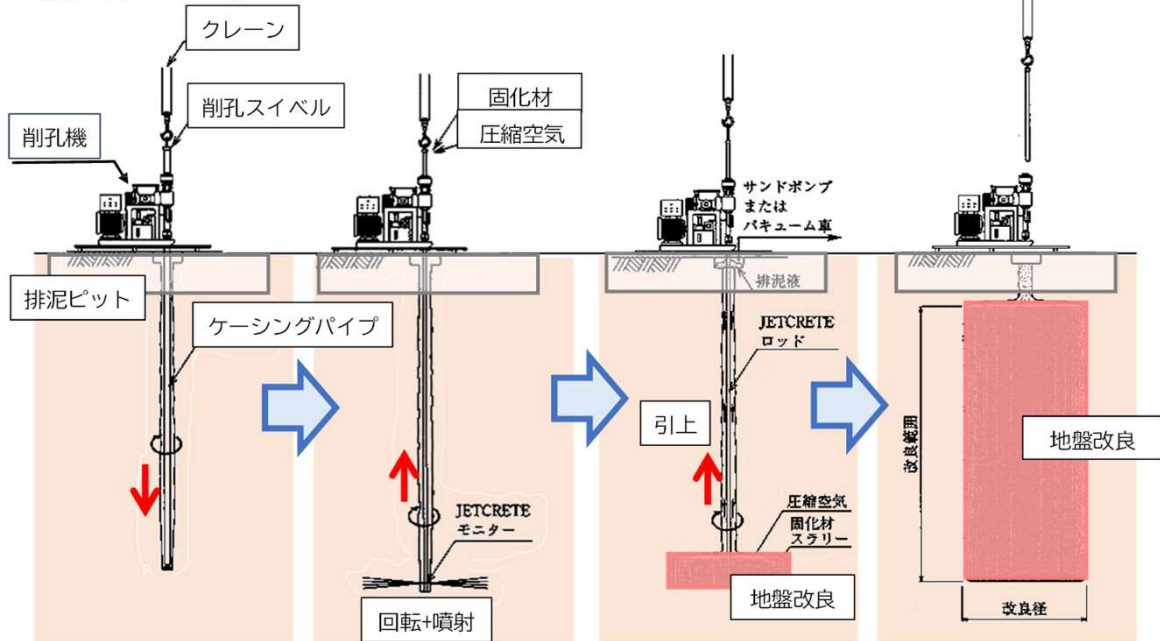

《下水道管復旧工事について》

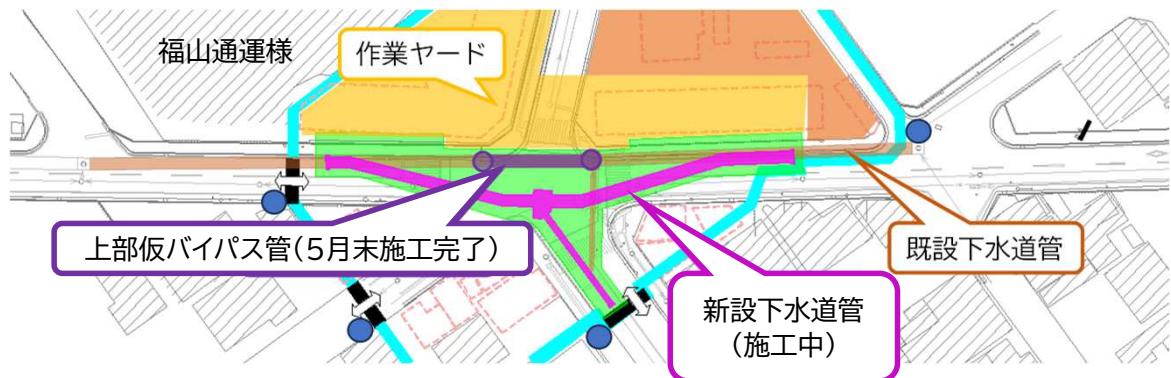

《道路陥没事故に関する情報について》

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【広島市からのお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/401284.html>

【清水・日本国土開発・広成JVからのお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>

《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV（担当：山本） 電話 082-555-9275

