

清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
広島市下水道局施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしており、心よりお詫び申し上げます。

地域の皆さまへは、工事の騒音等でご迷惑をお掛けしておりますが、細心の注意を払い工事を進めて参りますので、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《8月の作業内容》

昼間工事（8：00～18：00）※日曜日は原則休工とします。

- ・仮設工事（ヤード整備）
- ・下水道管復旧工事（マンホール躯体構築・既設下水道管撤去・新設下水道管設置）

夜間工事（18：00～翌5：00）

- ・下水道管復旧工事（マンホール躯体構築・既設下水道管撤去・新設下水道管設置）
- ※土・日曜日の夜間は原則休工とし、平日の夜間については工事進捗により決定します。

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30～9：00）および夜間は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。
- ・天候、進捗によっては予定を変更させていただく場合もございます。

《工程表（予定）》

| 年月日 工事内容 | 令和7年8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 仮設工事 | 【昼】工事ヤード整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査工事 | 【昼】ボーリング調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道管復旧工事 | 【昼】損傷部本復旧(マンホール躯体構築・既設下水道管撤去・新設下水道管設置) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9月中 完了予定 | | | | | | |
| | 【夜】損傷部本復旧(マンホール躯体構築・既設下水道管撤去・新設下水道管設置) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地表面沈下計測 | 【昼】地表面沈下計測、モニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。（J VのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

《次号 復旧工事かわら版 発行予定日》


- ・令和7年8月26日に発行を予定しております。

《9月の作業内容》



- ・仮設工事
- ・下水道管復旧工事（新設下水道管設置工、下水道管切替工、埋戻し工）
- ※下水道管切替工は土曜日・日曜日を含む昼夜連続作業を予定しています。

《現場状況写真について》

- ・地盤沈下対策工事

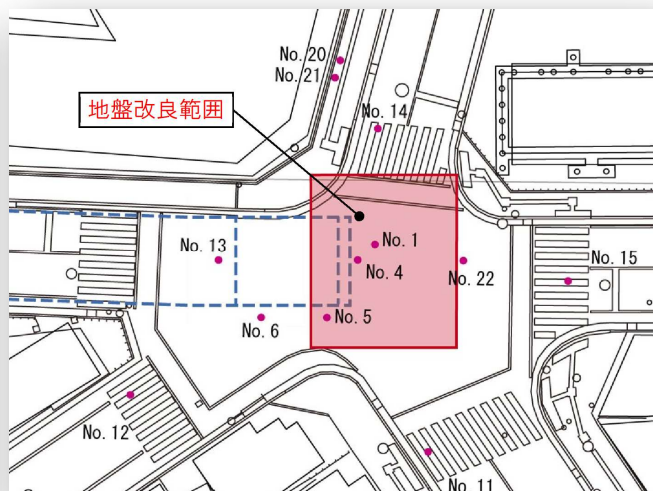

- ・下水道管復旧工事

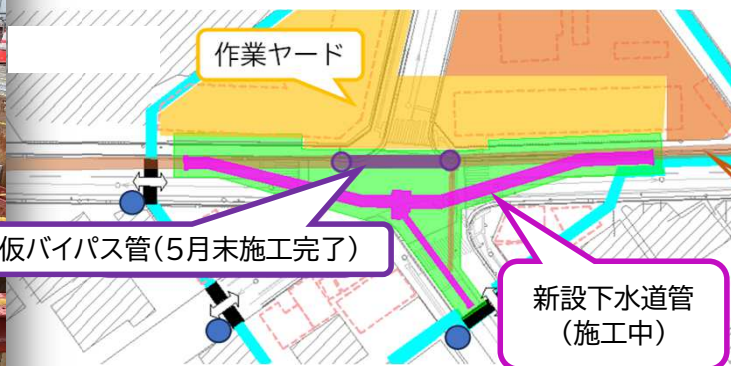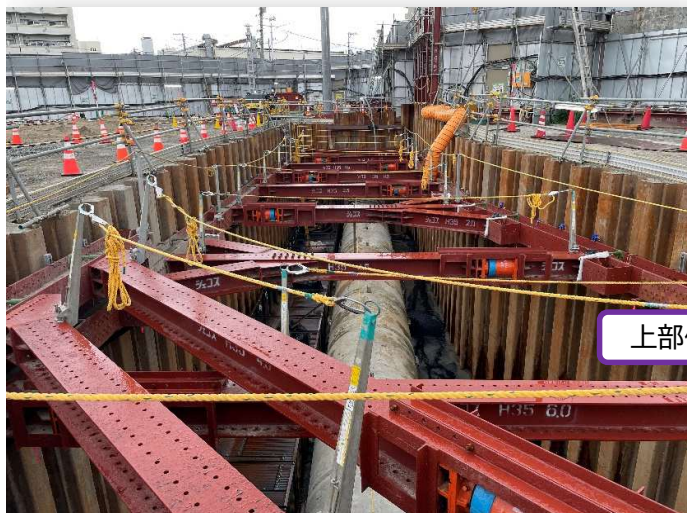

※写真の下水道管は既設管です。当該既設管を新設管に変更します。

《道路陥没事故に関する情報について》

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【広島市からののお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/401284.html>

【清水・日本国土開発・広成JVからののお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>



《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV（担当：山本） 電話 082-555-9275
