


2024年12月31日現在 天皇原トンネル(仮称)建設工事の
掘削進捗は **4.2%(91.8m)** です



● 天皇原トンネル(仮称)建設工事の掘削進捗状況

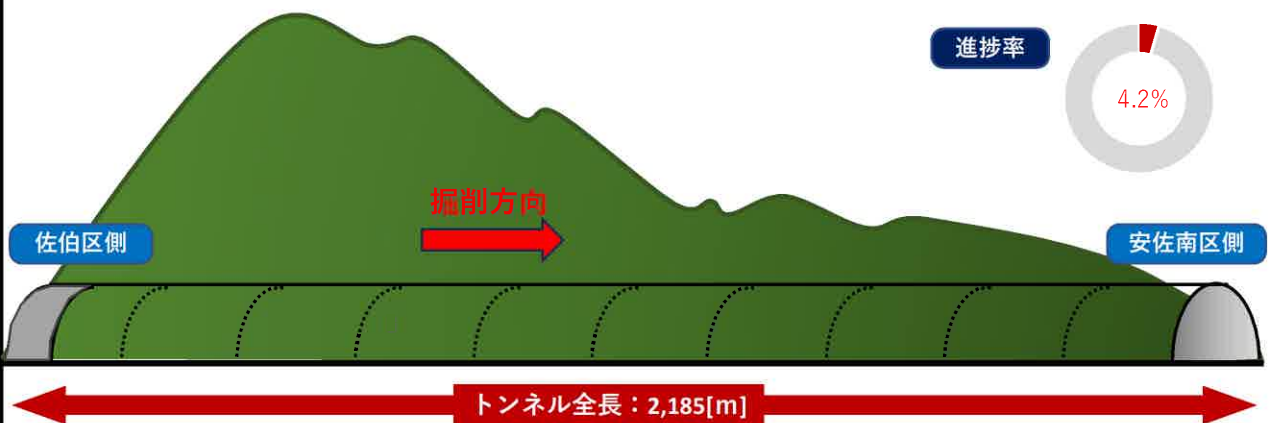

施工ヤード全景



トンネル施工状況



● 天皇原トンネル(仮称)建設工事の濁水処理状況

	浮遊物質(SS)[mg/L]	pH
排水基準※	90以下(日間平均70以下)	5.8以上8.6以下
最大値	16.2	7.4
最小値	0	6.6
平均値	7.3	6.8

※出典: 水質規制のしおり(広島県)



MAEDA



KOKUDO



前田・日本国土・河井建設
工事共同企業体
