

2025年5月30日現在

天皇原トンネル(仮称)建設工事の

掘削進捗は

20%(436.4m)

です

位置図




佐伯区



安佐南区


● 天皇原トンネル(仮称)建設工事の掘削進捗状況

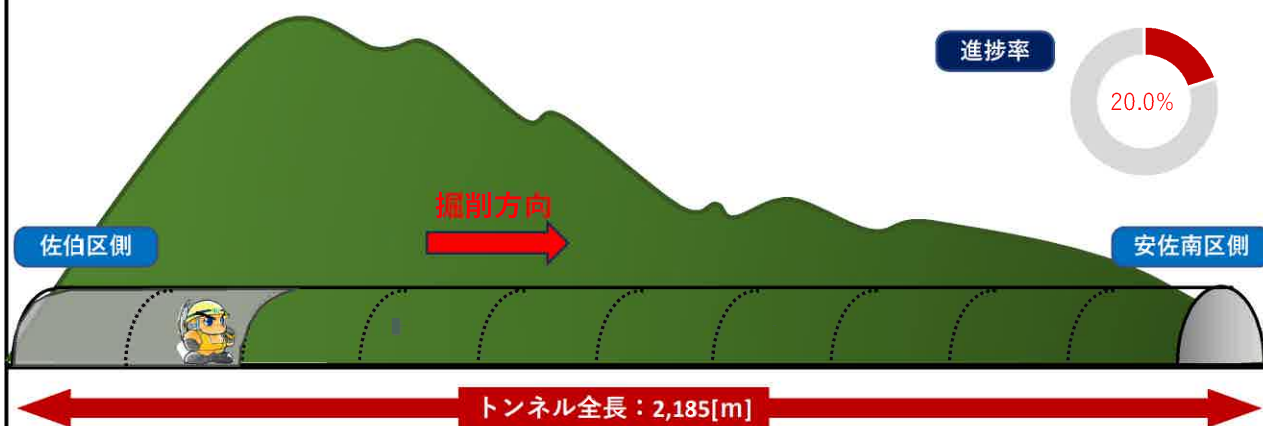

施工ヤード全景



トンネル施工状況

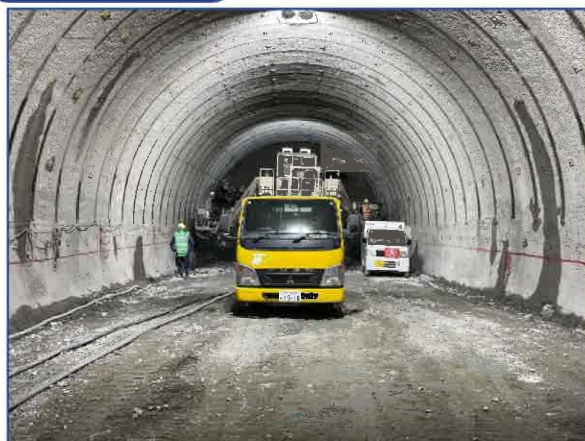

● 天皇原トンネル(仮称)建設工事の濁水処理状況

	浮遊物質量(SS)[mg/L]	pH
排水基準※	90以下(日間平均70以下)	5.8以上8.6以下
最大値	38.6	8.3
最小値	0.0	6.9
平均値	2.6	7.3

※出典：水質規制のしおり（広島県）



MAEDA



KOKUDO



前田・日本国土・河井建設
工事共同企業体
