

2025年8月31日現在

# 天皇原トンネル(仮称)建設工事の

掘削進捗は

**29.3%( 639.2m)**

です

位置図




佐伯区



安佐南区

## ● 天皇原トンネル (仮称) 建設工事の掘削進捗状況

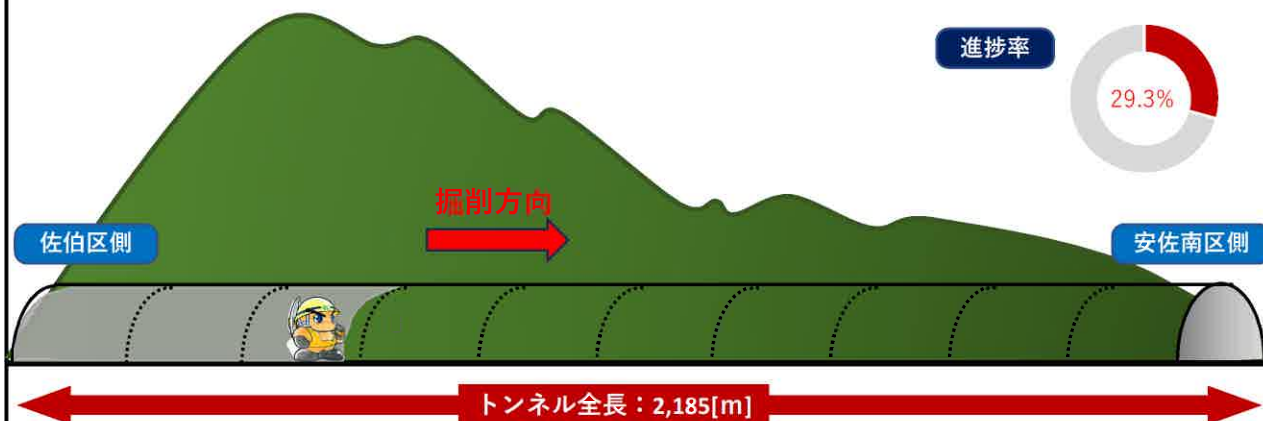

施工ヤード全景



トンネル施工状況



## ● 天皇原トンネル (仮称) 建設工事の濁水処理状況

|       | 浮遊物質(SS)[mg/L] | pH         |
|-------|----------------|------------|
| 排水基準※ | 90以下(日間平均70以下) | 5.8以上8.6以下 |
| 最大値   | 38.0           | 7.5        |
| 最小値   | 0.0            | 6.7        |
| 平均値   | 1.2            | 6.9        |

※出典：水質規制のしおり（広島県）



MAEDA



KOKUDO



前田・日本国土・河井建設  
工事共同企業体
