

2025年9月30日現在

天皇原トンネル(仮称)建設工事の

掘削進捗は

33.6%(733.3m)

です

位置図




佐伯区



安佐南区

天皇原トンネル (仮称) 建設工事の掘削進捗状況

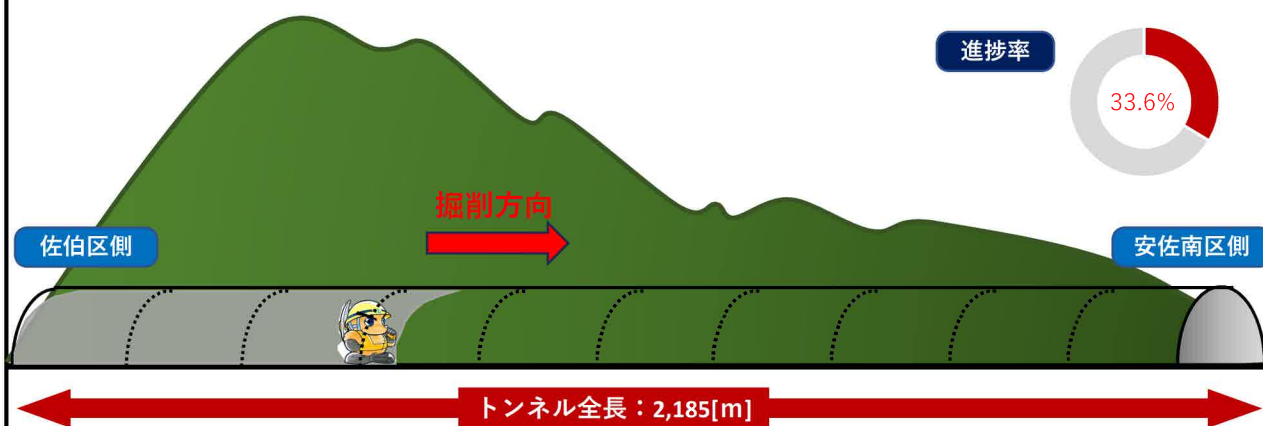

施工ヤード全景



トンネル施工状況



天皇原トンネル (仮称) 建設工事の濁水処理状況

	浮遊物質(SS)[mg/L]	pH
排水基準※	90以下(日間平均70以下)	5.8以上8.6以下
最大値	38.0	8.1
最小値	0.0	6.2
平均値	1.2	6.7

※出典：水質規制のしおり（広島県）



MAEDA



KOKUDO



前田・日本国土・河井建設
工事共同企業体
