

2026年5月31日現在

# 天皇原トンネル(仮称)建設工事の

掘削進捗は

## 65.9%(1439.2m)

です

位置図




工事場所

佐伯区

安佐南区



### 天皇原トンネル(仮称)建設工事の掘削進捗状況

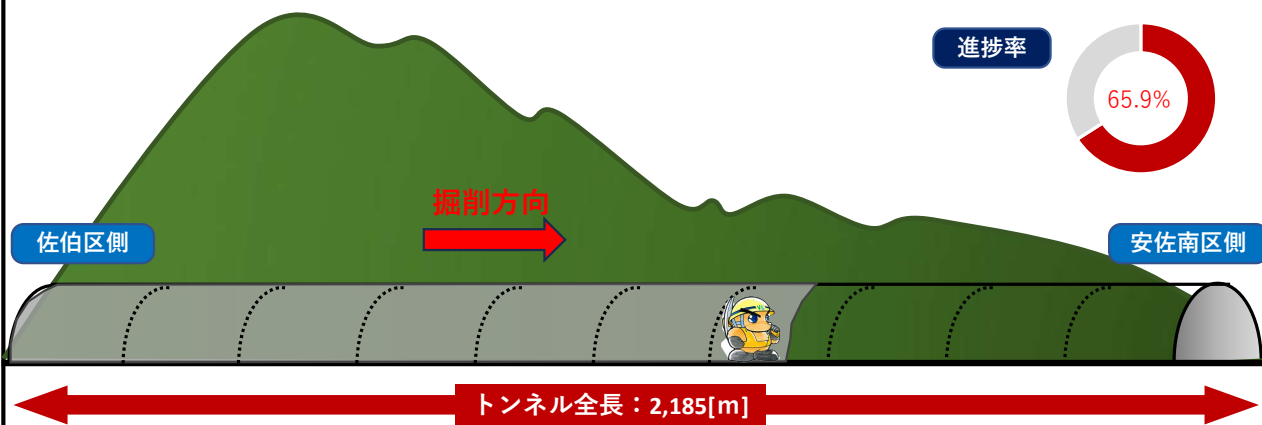

施工ヤード全景



トンネル施工状況



### 天皇原トンネル(仮称)建設工事の濁水処理状況

	浮遊物質(SS)[mg/L]	pH
排水基準※	90以下(日間平均70以下)	5.8以上8.6以下
最大値	38.8	8.3
最小値	0.0	6.6
平均値	9.8	7.1

※出典：水質規制のしおり(広島県)



MAEDA



KOKUDO



前田・日本国土・河井建設  
工事共同企業体
