

下水道工事に伴う道路陥没事故

復旧工事かわら版

令和8年
8月号

配布日：令和8年7月30日
清水・日本国土開発・広成JV
広島市下水道局 施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますが、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《8月の作業内容》

《凍土造成運転》

- ・地盤を凍結させるため、凍結機械を24時間運転します。
重機による作業はありません。

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30～9：00）は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。
- ・9月上旬から発進基地（裏面位置図参照）にて昼夜2交代制での作業を行います。
- ・交差点部においては、緊急時を除き夜間工事を行う予定はありません。
（夜間工事を行う場合は、別途お知らせします。）

《工程表（予定）》

年月日		令和8年8月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
工事内容																																
止水対策工 (凍結工)	24時間 機械作動	お盆休工 8/8(土)~8/16(日)																														
																																
		凍土造成運転 9月上旬完了予定																														
		――――																														
		※重機による作業はありません。																														
		※お盆休工中を含め、専門業者による運転管理・点検業務を行います。(お盆休工中も人の出入りがあります。)																														

※地表面沈下計測、モニタリングは継続しています。

※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。

（JVのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

《9月の作業内容》

- ・止水対策工（凍土造成・維持運転）：凍結機械を24時間作動します。
- ・原因究明工（水抜・土砂撤去）：発進基地内にて、発進立坑及びトンネル坑内の水抜き・土砂撤去を昼夜作業で行います。
*裏面に詳細を記載
日中は大型車両やダンプの搬入出があります。
- ・交差点復旧工：インフラ設備（下水道管小口径）の復旧を行います。
重機による作業があります。

原因究明工(水抜・土砂撤去) ※施工:9月上旬～

➡ 防音ハウス内において、昼夜2交代制での作業を予定しています。


昼間作業 8:00～18:00 夜間作業 20:00～翌6:00

防音ハウス



防音対策として、主に
防音ハウス内で作業を行います。

位置図

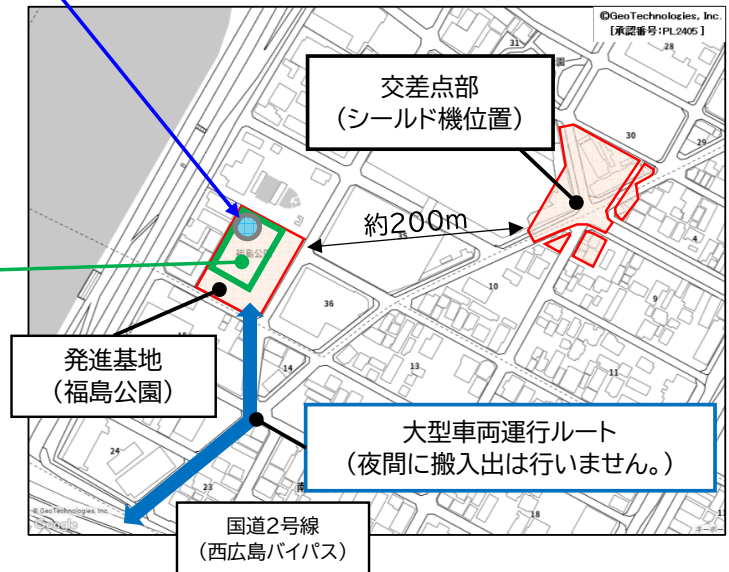

≪原因究明工(水抜・土砂撤去)の施工フロー≫

STEP1

①シールド内部の水抜・復水確認

STEP2


①土砂撤去設備の設置
②シールド内部水没設備の撤去

STEP3

①後続台車部の土砂撤去
②後続台車設備の撤去

STEP4

①マシン内部の土砂撤去
②シールドマシンの破損状況調査

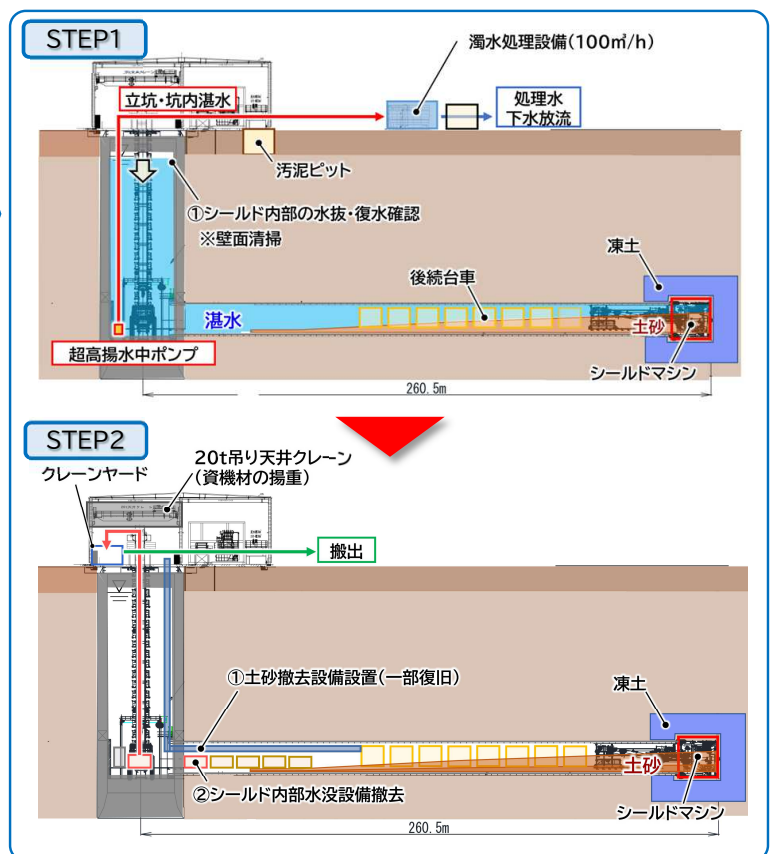

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【清水・日本国土開発・広成JVからのお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>

【広島市からのお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/suido-gesuido/1005966/1043539/1030467.html>



《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV
広島市 下水道局施設部管路課

電話 082-555-9275
電話 082-504-2421 (平日8:30～17:30)
