


恵下埋立地(仮称)浸出水放流管建設工事28-1

工事だより

平成28年10月号

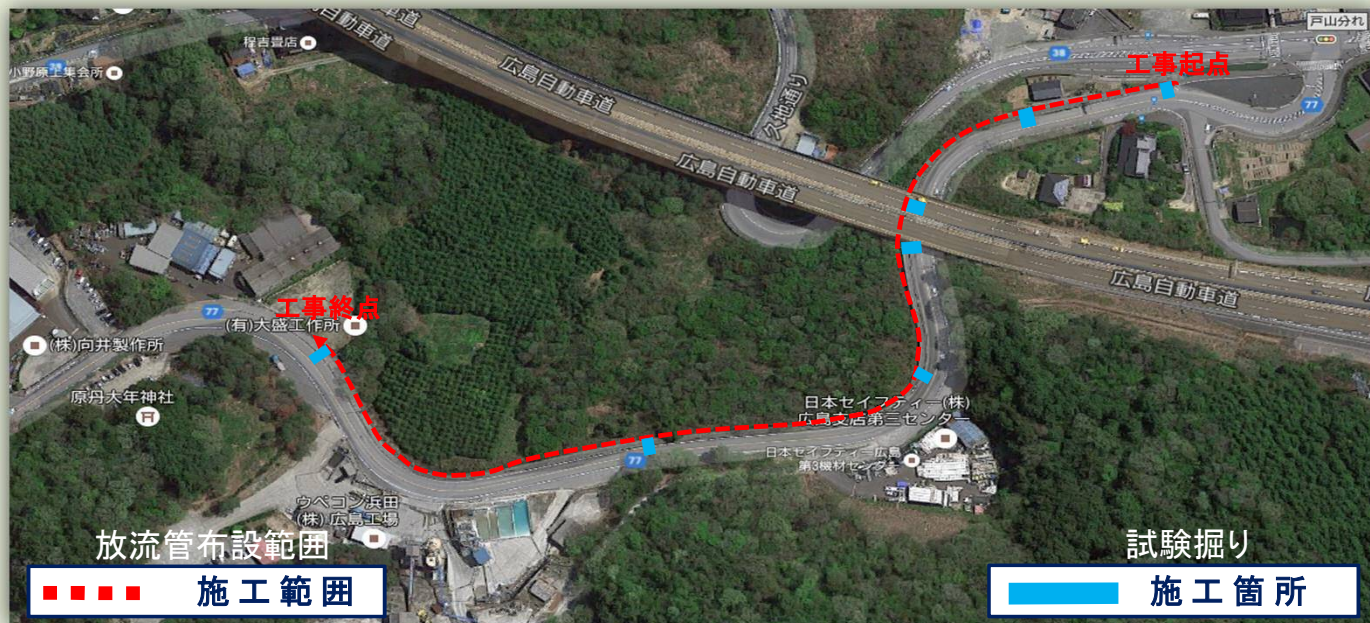

【これまでの実施内容について】

◆ポリエチレン管の施工に関する講習会実施



ポリエチレン管の優れた性能が現地でも発揮できるよう、管布設・継手等に関する講習会を開催しました。

◆試験掘り施工



地下埋設管位置の確認




埋戻し締めめ状況

管布設に支障となる他の埋設物の有無を調査しました。掘削後の復旧は、大型車が通行しても問題ないように、入念に埋戻しを行った後、仮舗装を行いました。

【工事の目的について】

埋立地で発生する浸出水を公共下水道へ放流するための管きょ工事です。
管布設完了後、道路(車両走行部分)の全面復旧を行います。

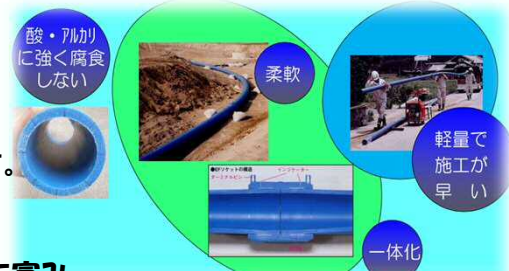

【管の材質について】

放流管は、酸・アルカリに強く腐食しにくく、柔軟性に富み耐震性能に優れたポリエチレン管を使用します。

【工事の工程について】

下表のとおり計画しています。

工種	H28.9	H28.10	H28.11	H28.12	H29.1
準備工	●	●			
マンホール工		試験掘り			
管きょ工		本工事着工予定時期			
舗装復旧工					

【現在の進捗】

道路を部分的に掘り、埋設されている管の位置や深さ等を確認する試験掘りが完了しました。引き続き、資器材の手配が整い次第本工事に着手します。

【お問い合わせ先】

施工者：(株)まるしん産業

発注者：広島市 環境局 施設部
恵下埋立地建設事務所

東区戸坂山崎町4番47号
TEL (082)-229-6123



TEL (082)-923-6011
