2026年10月31日現在　**天皇原トンネル(仮称)建設工事の**

掘削進捗は　83.2%(1818.8m)　です

位置図





天皇原トンネル（仮称）建設工事の掘削進捗状況

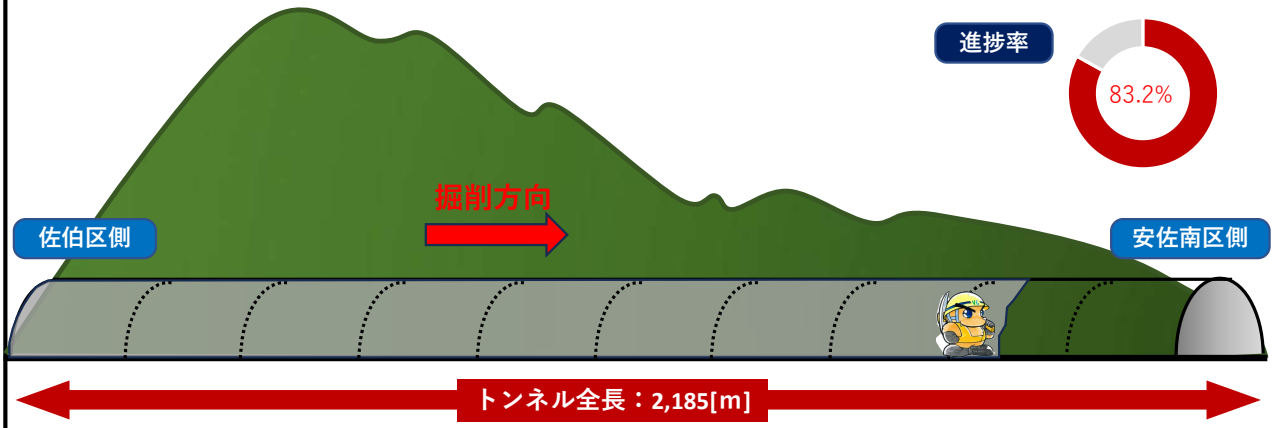

施工ヤード全景



トンネル施工状況



天皇原トンネル（仮称）建設工事の濁水処理状況

	浮遊物質量(SS)[mg/L]	pH
排水基準※	90以下(日間平均70以下)	5.8以上8.6以下
最大値	38.6	8.3
最小値	0.0	6.2
平均値	21.1	6.6

※出典：水質規制のしおり（広島県）

MAEDA　KOKUDO

前田・日本国土・河井建設

工事共同企業体
