下水道工事に伴う道路陥没事故

復 旧 工 事 か わ ら 版

令和８年
１１月号

配布日：令和８年１０月３０日
清水・日本国土開発・広成ＪＶ
広島市下水道局　施設部管路課

《１１月の作業内容》

発進基地内

- **土砂撤去工（昼夜２交代制）**
  発進基地内にて、トンネル坑内の土砂および水没設備の撤去を行います。
  大型工事車両の搬入出があります。

交差点部

- **凍土維持運転（２４時間）**
  地盤を凍結させるため、凍結機械を２４時間運転します。（重機作業なし）


- **下水道復旧工（昼間工事８：００～１８：００）**
  損傷した下水道管（小口径）およびマンホールの復旧を行います。

《その他》

・通勤通学時間帯（７：３０ ～ ９：００）および夜間は大型工事車両の搬入出（通行）はありません。

・交差点部においては、緊急時を除き夜間工事を行う予定はありません。
（夜間工事を行う場合は、別途お知らせします。）

《工程表（予定）》

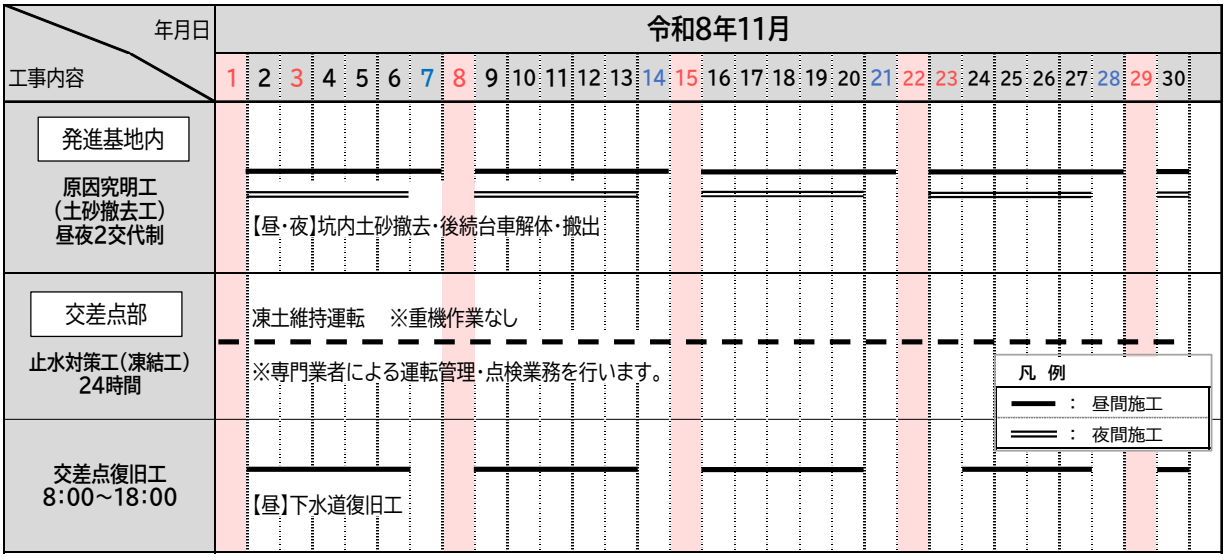

※地表面沈下計測のモニタリングは継続しています。
※週間工程等は現地デジタルサイネージ及びJVのホームページにて確認できます。

《１２月の作業内容》

発進基地内

- **土砂撤去工（昼夜２交代制）**
  発進基地内にて、トンネル坑内の土砂および水没設備の撤去を行います。

交差点部

- **凍土維持運転（２４時間）**
  凍結した地盤を維持させるため、凍結機械を２４時間運転します。（重機作業なし）


- **下水道復旧工（昼間工事８：００～１８：００）**
  損傷した下水道管（小口径）およびマンホールの復旧を行います。

発進基地内

原因究明工（土砂撤去工）

トンネル坑内の水没設備を撤去し、土砂撤去作業に必要な設備を復旧しました。
引き続き土砂撤去作業を行います。

土砂撤去状況図

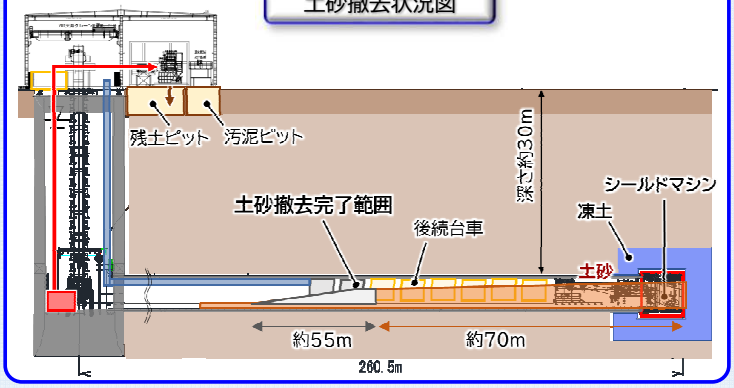

状況写真



交差点部

交差点復旧工（下水道復旧）

福島第一公園から交差点にかけて
下水道管およびマンホール2か所の
復旧を行いました。
引き続き下水道復旧を行います。


新設下水道管




新設マンホール



平面図

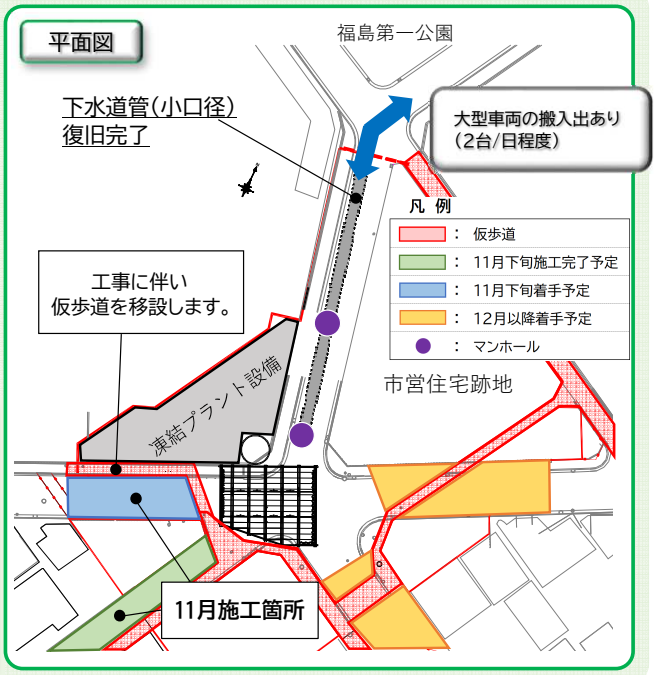

位置図

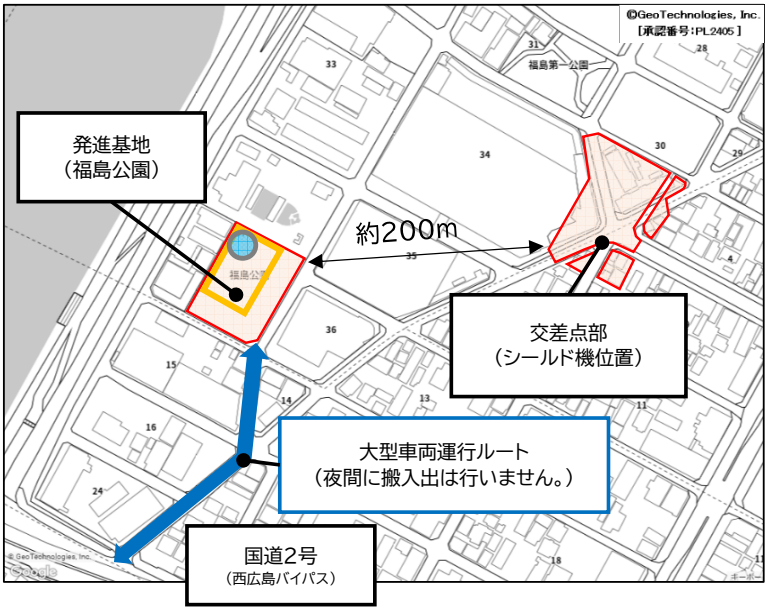

《ホームページ・お問合せ先》

・清水・日本国土開発・広成ＪＶ

☏ 082-555-9275

・広島市下水道局

☏ 082-504-2421
（平日8：30～17：30）
