事 後 調 査 計 画 書

平成２４年１２月２１日

広 島 市 長　 様

事業者（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
住所　広島市南区的場町二丁目６番７号
氏名　広島駅南口Ｂブロック市街地再開発組合
理事長　前岡 眞仁
電話番号　082-263-3196

広島市環境影響評価条例第30条２項の規定により、次のとおり事後調査計画書を提出します。

対象事業の名称	広島駅南口Ｂブロック第一種市街地再開発事業
事後調査の種類	■ 工事の実施中　□ 工事の完了後
工事の着手~~又は完了~~の年月日	平成２４年１２月３日
事後調査の項目及び手法	別紙のとおり
事後調査を行う期間	平成２４年１２月～平成２８年３月
事後調査報告書の提出の時期	第１回目　平成２６年１月末 第２回目　平成２７年１月末 第３回目　平成２８年１月末 最　終　建設工事完了後３カ月以内
その他	（委託業者名） 名　称 代表者　未定 所在地

(注)1　事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を「その他」の欄に記載してください。
2　記載事項を枠内に記入できないときは、別紙に記載し、添付してください。

別　紙

工事の実施中における事後調査の項目及び手法

本事業における工事の実施中の事後調査の項目及び手法は、表-１に示すとおりである。また、調査地点は図-１に示すとおりである。

表-１　工事の実施中における事後調査の項目及び手法等

項　　目		調査方法	調査地点	調査時期
騒音	環境騒音及び敷地境界騒音	建設機械の稼働に係る騒音の測定 JIS Z 8731 に準拠	直近住居付近 2 地点 敷地境界 2 地点	平成 25 年 10 月～ 平成 25 年 12 月※ 工事最盛期 （平日１日） 工事時間帯に測定
振動	環境振動及び敷地境界振動	建設機械の稼働に係る振動の測定 JIS Z 8735 に準拠	直近住居付近 2 地点 敷地境界 2 地点 （騒音測定地点と同じ地点）	平成 25 年 10 月～ 平成 25 年 12 月※ 工事最盛期 （平日１日） 工事時間帯に測定
廃棄物等	廃棄物・残土	残土の発生量・処分量・処分方法・リサイクル量建設廃棄物の月別・種類別発生量・排出量・リサイクル量に関する資料調査	事業計画地内	平成 24 年 12 月～ 平成 28 年 3 月 全工事期間中 （１回/年　報告）
その他	建設機械及び工事用車両の稼働状況	機種、形式、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の有無及び各々の稼働時間、工事用車両の出入台数に関する資料調査	事業計画地内	平成 24 年 12 月～ 平成 28 年 3 月 全工事期間中 （１回/年　報告）

平成 25 年 10 月～平成 25 年 12 月※：左記期間がピークと予測されますが、調査実施前に進捗状況を勘案し、詳細工事工程により調査実施日を決定します。

添付資料

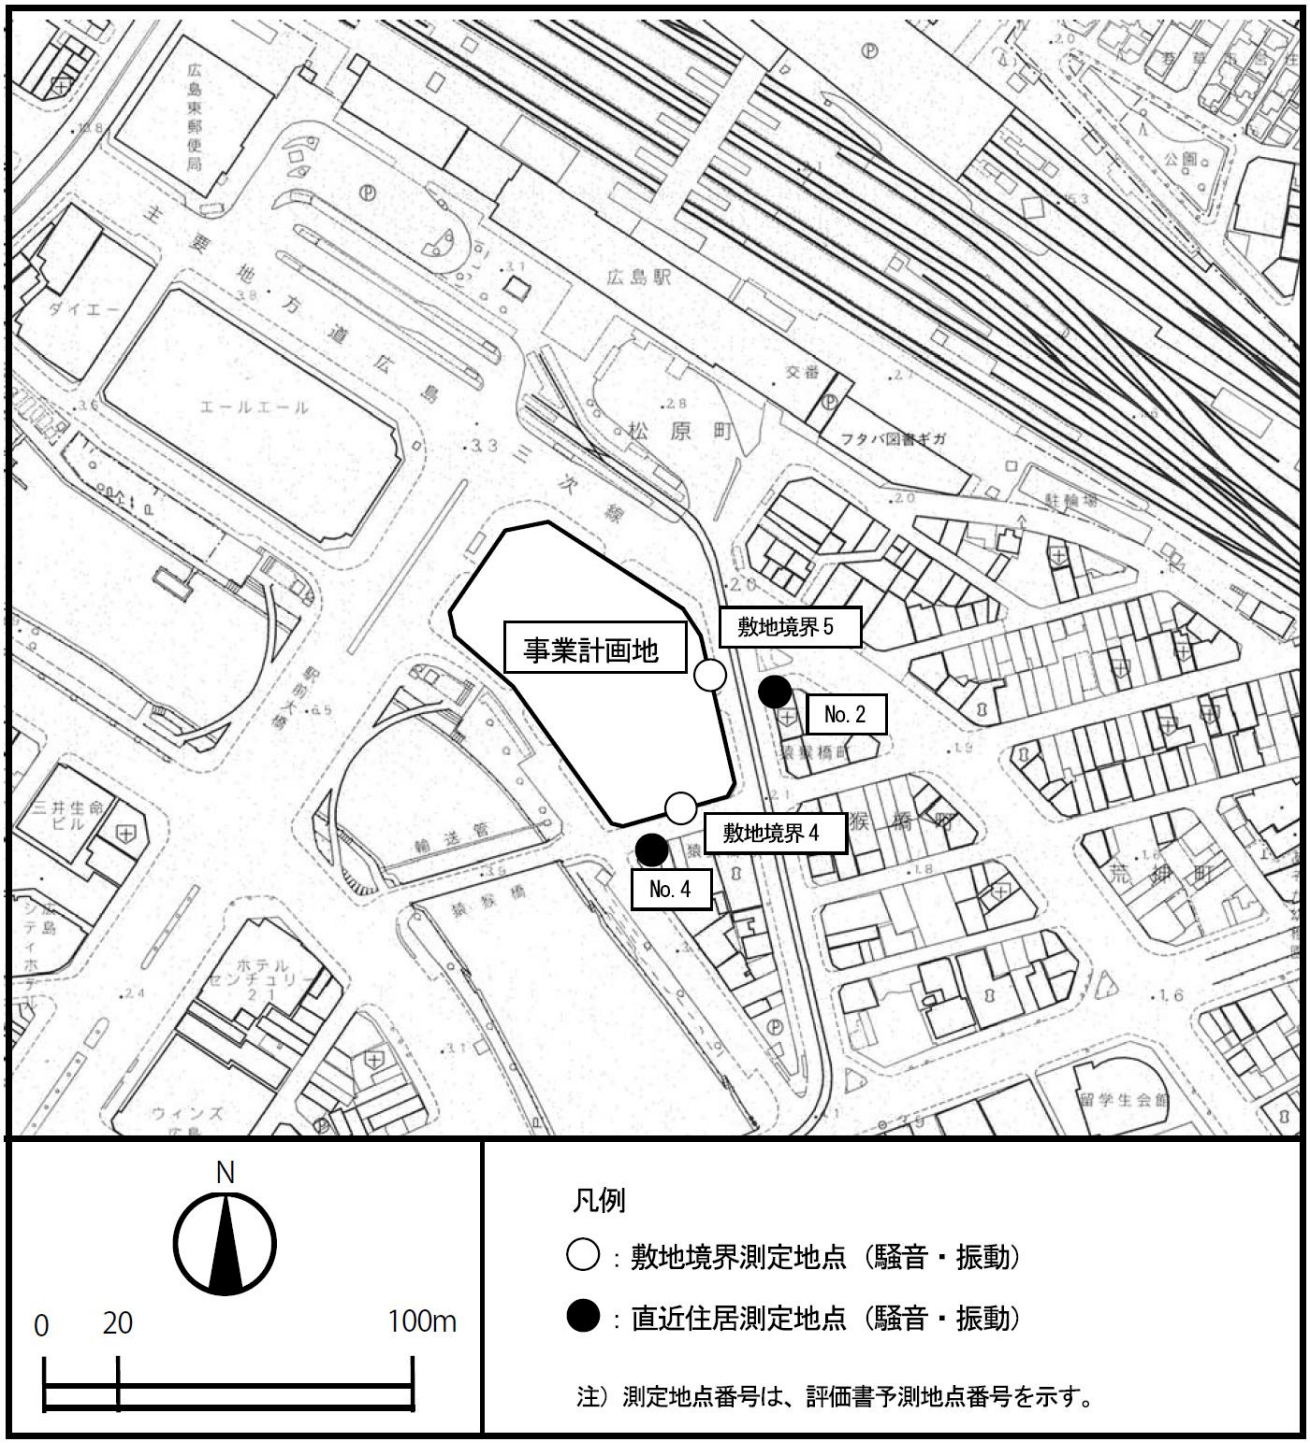

図-1　工事の実施中における事後調査地点図
