


ワンデーレスポンス実施フロー

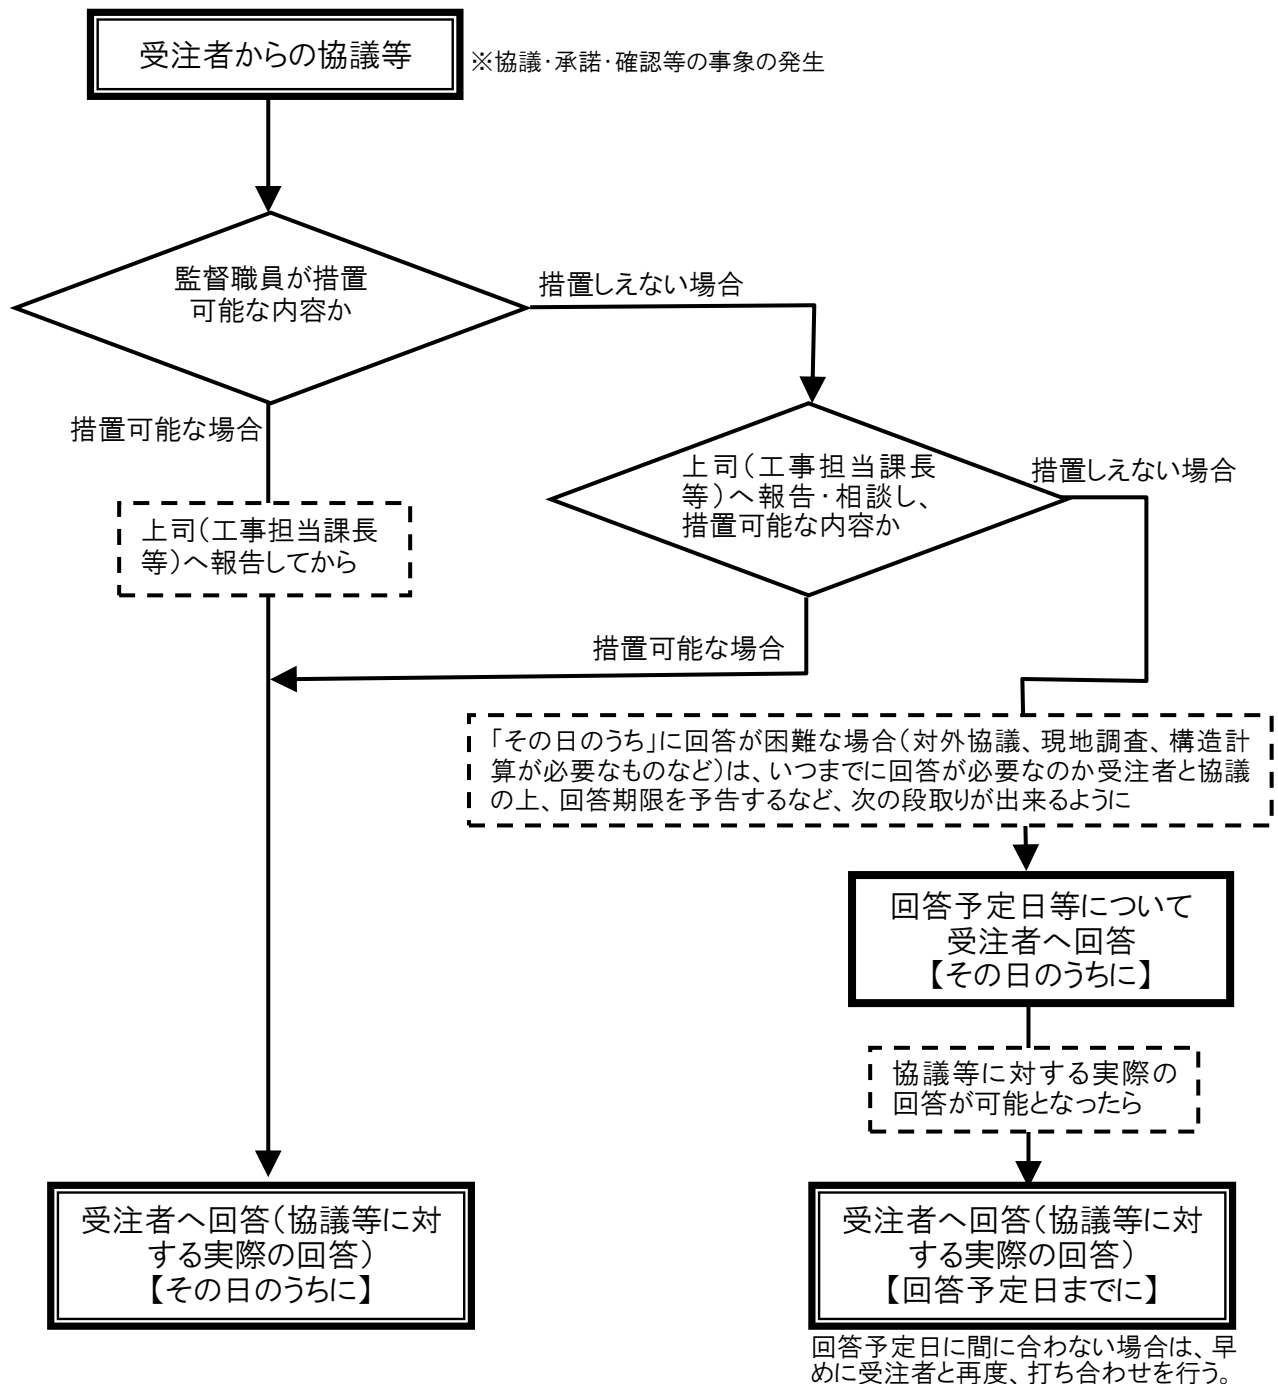

【参考】

ワンデーレスポンス実施対象工事において、通常、監督職員が取り組む内容について

監督職員は、施工計画書に記載する計画工程表の受理にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、受注者とよく協議しておく。

- ・横線式工程表(バーチャート)、座標式工程表(グラフ式)、曲線式工程表(バナナ曲線)、ネットワーク式工程表による工程管理の実施など
